



MCA MOÇAMBIQUE BOLETIM

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOÇAMBIQUE

1ª Edição - Janeiro 2012



MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION
UNITED STATES OF AMERICA

"As nações ricas do mundo devem imediatamente implementar um massivo e sustentado Plano Marshall para a Ásia, África e América do Sul. Um programa genuíno por parte das nações ricas para tornar a prosperidade uma realidade para as nações pobres, vai em última instância, acrescer a prosperidade de todos"

Martin Luther King, Jr.

Este é o cerne da missão do MCC, que está a ser actualmente implementada pelo MCA-Moçambique com o objectivo de aumentar a capacidade produtiva da população e reduzir a pobreza em Moçambique através do crescimento económico nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambézia.

Dr. Martin Luther King, Jr.
(15 de Janeiro de 1929
- 4 de Abril de 1968)

Principais realizações do MCA-Moçambique no 3º ano do Compacto: Projecto de Água e Saneamento...

Página 3

Principais realizações do 3º ano (Outubro 2010 - Setembro 2011) do Projecto de Reabilitação de Estradas pelo MCA-Moçambique

Página 6

... ficou demonstrado que é possível manter os níveis de infestação do ALC a níveis aceitáveis (abaixo dos 2%)

Página 9



Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento



Projecto de Reabilitação e Construção de Estradas



Projecto de Acesso e Posse Segura de Terra



Projecto de Apoio ao Rendimento do Agricultor

Caros leitores,

O MCC e o MCA-Moçambique juntaram-se na celebração do dia de Martin Luther King, Jr, que nos Estados Unidos da América é feriado federal que assinala o aniversário natalício do Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. A data comemora-se em todos os anos na terceira segunda-feira de cada mês de Janeiro (e este ano calhou a 16 de Janeiro de 2012), que coincide com o tempo do aniversário natalício do Rev. Dr. King a 15 de Janeiro.

Muita gente em todo o mundo está familiarizada com o discurso do Dr. King intitulado "I Have A Dream", (Eu tenho um sonho) ou "Carta da Prisão de Birmingham". Contudo, uma das suas obras relativamente desconhecida, é a incrível "The World House essay" (Dissertação sobre "A Casa Global", que é o último capítulo do seu livro, "Where Do We Go From Here: Chaos or Community?" (Para onde vamos daqui: caos ou comunidade? Este trabalho é baseado na sua aula de sapiência que deu na Universidade de Oslo, na Noruega, por ocasião da sua atribuição do prêmio Nobel da Paz a 11 de Dezembro de 1964. Na obra "A Casa Global" a mensagem aí dada apela às pessoas a transcender os preconceitos de raça, classe, nação e religião para abraçarem a visão de uma **Casa Global** e para erradicarem a nível global o racismo, pobreza, militarismo e no seu Plano Marshall, ele afirma que a pobreza mundial deve ser erradicada. No dia 4 de Abril de 1968, Martin Luther King foi morto a tiro com apenas 39 anos de idade por James Earl Ray, enquanto estava na varanda do Lorraine Motel em Memphis. Na época em que foi assassinado, Martin Luther King Jr, estava a concentrar as suas atenções na promoção de uma campanha à escala nacional destinada a ajudar os pobres.

Martin Luther King Júnior, propôs: "Um programa genuíno por parte das nações ricas para tornar a prosperidade uma realidade para as nações pobres, vai em última instância, acrescer a prosperidade de todos. Uma das melhores provas de que realidade assenta em fundamentos morais é o facto de que quando os homens e governos trabalham dedicadamente para o bem dos outros, eles alcançam o seu próprio enriquecimento".

"As nações ricas do mundo devem imediatamente implementar um massivo e sustentado Plano Marshall para a Ásia, África e América do Sul. Um programa genuíno por parte das nações ricas para tornar a prosperidade uma realidade para as nações pobres, vai em última instância, acrescer a prosperidade de todos"

Este é o cerne da missão da MCC, que está a ser actualmente implementada pelo MCA-Moçambique com o objectivo de aumentar a capacidade produtiva da população e reduzir a pobreza em Moçambique através do crescimento económico em distritos e municípios seleccionados nas províncias da Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa na zona norte do país.

Portanto, assim que nos juntamos aos nossos contrapartes do MCC e todos os cidadãos norte-americanos nesta celebração, queremos materializar o legado do Rev. Dr. Martin Luther King Jr, implementando na íntegra o Compacto ao MCA-Moçambique que acreditamos através dos seus objectivos de aumentar o abastecimento e a qualidade de Água e Saneamento, melhoria do acesso aos mercados produtivos através da reabilitação de Estradas, melhoria do acesso e posse segura de terra e apoio à renda dos Agricultores é a abordagem correcta para a materialização dos ideais do Dr. Martin Luther King Jr. para a erradicação da pobreza.



MCA-Mozambique
Director Executivo
Paulo Fumane



**Principais Realizações do MCA-Moçambique no 3º ano do Compacto (Out 2010 a Set 2011):
1 - Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento em 3 cidades**

Resumo do Projecto

| COMPONENTE | PROVÍNCIA | CIDADE |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Abastecimento de Água em 3 Cidades | Nampula | Nampula |
| Saneamento e Drenagem em 3 Cidades | Nampula e Zambézia | Nampula e Quelimane |
| Abastecimento de Água, Saneamento e Drenagem em 5 Cidades | Nampula | Nacala |
| Barragem de Nacala | Nampula | Distrito de Nacala Velha |
| Construção e Reabilitação de 600 fontes de água | C. Delgado - 250 Fontes Nampula - 350 Fontes | 5 Distritos (+1) 7 Distritos |

Principais Actividades Realizadas no 3º Ano: Abastecimento de água - O foco principal é a cidade de Nampula, com um contracto assinado com o consórcio CMC/CETA no valor de US\$34,821,932.85. A duração do projecto é de 18 meses (Setembro 2011 a Março de 2013).

O objecto do contracto é o seguinte:

- **LOTE 1:** Reabilitação e ampliação da capacidade da Estação de Captação e Tratamento de Água (ETA);
- **LOTE 2:** Construção de uma nova Conduta Adutora e um novo Centro Distribuidor (Reservatório de Distribuição).

Actividades realizadas:

- Mobilização do Fiscal (Burnside Internacional);
- Mobilização do Representante do Dono da Obra (Eng. José Chambisso-FIPAG);
- Mobilização do Empreiteiro;
- Montagem do Estaleiro & Actividades Preliminares;
- Limpezas e Demolição de edificios no local da nova ETA;
- Actividades do Reassentamento e Compensação a decorrer satisfatoriamente;

PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA QUELIMANE E PEMBA

- Concluída a pesquisa adicional de água subterrânea;
- Concluída a perfuração de 4 novos furos de produção em Pemba, com capacidade total por averiguar nos ensaios;
- Concluída a perfuração de 4 novos furos de produção em Quelimane, com capacidade por averiguar nos ensaios;
- Condições criadas para a finalização dos estudos de viabi-

lidade;

- Com a reorientação dos fundos, não está prevista a execução de obras, apenas serão equipados os furos de produção e garantida a sua ligação às condutas adutoras existentes.

DRENAGEM E SANEAMENTO - 3 CIDADES

A cidade principal da concentração é Quelimane com um contracto assinado com o consórcio CMC/CETA no valor de US\$26,742,643.00. A duração para este projecto é de 16 meses (Setembro 2011/Março 2013).

O objecto do contracto é o seguinte:

- Reabilitação de 2.3km de galerias e 200 entradas de águas pluviais;
- Construção de 8.4km de tubos de drenagem e 2.1km de galeria;
- Realinhamento, Remodelação e Recuperação de 11km de canais abertos de drenagem de águas pluviais.

Actividades realizadas em Quelimane:


- Mobilização do Fiscal (Louis Berger, SAS);
- Mobilização do Representante do Dono da Obra (Eng. Fernando Nhamossa-AIAS);
- Mobilização do Empreiteiro, em curso;
- Montagem do Estaleiro & Actividades Preliminares (em curso);
- Actividades de compensação da população afectada pela reabilitação (em curso);
- Em curso a finalização e preparação para a construção das 26 casas para os PAPs;

Actividades realizadas em Nampula:

- Concluída a elaboração do Projecto Detalhado;
- Lançado o Concurso de Obras para drenagem pluvial – Fecho a 10/01/2012;
- Previsão do Início das Obras: Março de 2012;
- Concluída a preparação dos documentos de concurso para a implementação dos programas de saneamento a baixo custo (sensibilização e construção).

Objectos do Contracto:

- Intervenção em locais com problemas críticos de erosão;
- Saneamento a Baixo Custo (sensibilização e construção);



Actividades realizadas em Pemba:

- Em processo de finalização o Projecto Executivo de Engenharia para drenagem pluvial;
- Com a reorientação dos fundos, não está prevista a execução de obras de melhoramento do sistema.

ÁGUA E SANEAMENTO - 5 CIDADES

A cidade principal da concentração é Nacala com um contracto assinado com a empresa de construção "TechnoFab/Gammon". O valor deste contrato é US\$ 28,049,090.94 com uma duração de 18 meses. (Setembro de 2011/Março de 2013).

Os objectos deste contracto são:

- LOTE 1: Construção de uma Estação de Captação e Tratamento da Conduta Adutora e Estação Elevatória;
- LOTE 2: Reservatórios semi-enterrados e elevados, Estação de Bombagem e Conduta de Distribuição.

Actividades realizadas em Nacala:

- Mobilização do Fiscal (Burnside Internacional);
- Mobilização do representante do Dono de Obra (Eng. Henry Cossa - FIPAG);
- Mobilização do Empreiteiro, em curso;
- Iniciadas Actividades Preliminares (documentos de pre-construção e topografia);
- Iniciado processo de compensação e reassentamento da população afectada pela reabilitação.

Actividades realizadas em Mocuba:

- Terminada a elaboração do Projecto Executivo de Engenharia;
- Lançado Concurso e avaliadas as propostas de execução das obras; – infelizmente por as propostas submetidas estarem acima do orçamento disponível foi cancelada a contratação das obras;
- Iniciado o processo alternativo para a execução de obras de emergência para o melhoramento do sistema.

Actividades realizadas em Monapo e Gurúè:

- Terminada a elaboração do Projecto Executivo de Engenharia;
- Com a reorientação dos fundos, não está prevista a execução de obras de melhoramento do sistema.

Actividades realizadas em Montepuez:

- Concluída a pesquisa adicional de água subterrânea;
- Em curso a perfuração e reabilitação de 5 novos furos de

produção com capacidade total por averiguar por ensaios de bombagem;

- Condições criadas para a finalização dos Estudos de Viabilidade;
- Com a reorientação dos fundos não está prevista a execução de obras, apenas serão equipados os furos de produção e garantida a sua ligação às condutas adutoras existentes.

REABILITAÇÃO DA BARRAGEM DE NACALA

O contrato foi assinado com a empresa "WBHO" no valor de US\$26,212,132.95. A duração das obras é de 21 meses. (Junho de 2011/Março de 2013).

Os objectos deste contracto são:

- Reassentamento da população afectada pela reabilitação;
- Desvio permanente da Estrada Nacional N 12;
- Construção de novo descarregador de cheias;
- Alteamento da barragem em 4 metros;
- Construção de nova tomada de água com descarga de fundo.

Actividades em curso:

- Mobilização do Fiscal (Jeffares & Green);
- Mobilização do Representante do Dono da Obra (Eng. Carlos Bonete – "DNA-GOH");
- Reassentamento (compensação dos PAPS concluída e em curso a construção de habitações e infraestruturas);
- Em curso a execução da Ensecadeira para as obras da tomada de água;
- Em curso a execução do desvio temporário;
- Em curso a execução do aterro para o desvio definitivo;

3 Principais Realizações do 3º ano do Projecto de Água Rural

| Designação | Previsão | Actual | Impacto do Projecto |
|--------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fontes de Água construídas | 600 | 238 | <ul style="list-style-type: none"> • Mais de 119 mil pessoas tem acesso à água potável; • Redução em 22% do Custo das Obras em relação ao primeiro pacote de obras; • Aumento do nível de serviço: em preparação adenda ao contrato do empreiteiro para construção de 8 Mini-sistemas com painéis solares. |
| Estabelecimento de Comités de Gestão | 600 | 417 | <ul style="list-style-type: none"> • Mais de 500 comunidades contribuíram com fundos de participação (1.360.000,00 MT); • Maior envolvimento da mulher (50%). |
| Treinamento em Higiene e Saneamento | 7200 | 37500 | <ul style="list-style-type: none"> • Redução de doenças de origem hídrica; • Melhoramento das condições de higiene; • Criados Centros de Demonstração de Saneamento; • Construção e uso de Latrinas (Mais de 8 mil). |



2 - Principais realizações do MCA-Moçambique no 3º ano do Compacto (Out 2010 a Set 2011) Projecto de Reabilitação de Estradas


O projecto original previa a reabilitação de 493 km de estradas pavimentadas sendo:

- **Chimuara-Nicoadala** na província da Zambézia, com (165,5 km) de extensão;
- **Rio Ligonha-Nampula** na província de Nampula, com (103 km) de extensão;
- **Namialo-Rio Lúrio** na província de Nampula, com (150 km) de extensão;
- **Rio Lúrio-Metoro** na província de Cabo Delgado (74,8 km) de extensão;

Devido aos altos custos de Construção em 2011, apenas 253 kms de estrada estão agora a ser reabilitados a saber:

- **Rio Ligonha-Nampula** na província de Nampula, com (103 km)
- **Namialo - Rio Mecutuchi** (75 km), e
- **Rio Mecutuchi - Rio Lúrio** (75 km)

O MCA-Moçambique concluiu todos os estudos de viabilidade para o impacto ambiental/social para todas as estradas (5) no âmbito do Programa (493 kms).

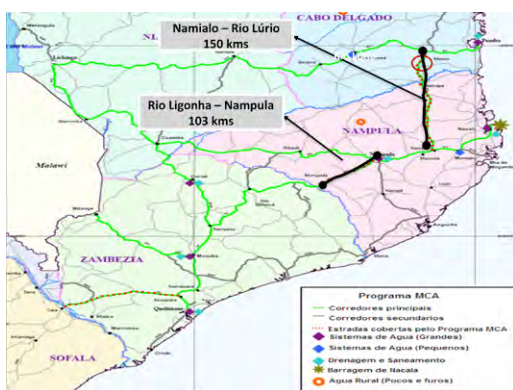

Estrada Rio Ligonha-Nampula: marcos importantes realizados:

- Lançamento de concurso;
- Avaliação de propostas de Empreitada;
- Negociação com a empresa vencedora;
- Assinatura do contrato;
- Desminagem de pontes;
- Início das obras (mobilização);
- Início de montagem do acampamento de obras;
- Testagem dos materiais de construção (solos, brita, etc)
- Aquisição de equipamentos e contratação de mão de obra);
- Implementação do RAP e relocação da fibra óptica;
- Lançamento do concurso e avaliação de propostas para a recolocação de postes eléctricos

Namialo - Rio Lúrio: marcos importantes realizados:

- a) Lançamento do concurso para a implementação do Plano de Acção para o reassentamento das Pessoas Afectadas pelo Projecto (PAPs) e supervisão da construção da estrada.

O concurso foi dividido em dois troços:

Lote 1: **Namialo - Mecutuchi** e

Lote 2: **Mecutuchi - Rio Lúrio**

Além das actividades mencionadas no Rio Ligonha-Nampula, na estrada Namialo - Rio Lúrio o MCA fez o seguinte:

- Desminagem de câmaras de empréstimos;
- Iniciou a Implementação do Plano de Acção de Reassentamento;
- Iniciou a relocação da fibra óptica;
- Iniciou a limpeza e alargamento da estrada existente;
- Iniciou a limpeza de aquedutos.

b) Lançamento do concurso para a implementação do Plano de Acção para o Reassentamento das Pessoas Afectadas pelo Projecto (PAPs) e supervisão da construção da estrada:

Marcos importantes realizados:

- Conclusão da montagem dos acampamentos de obras;
- Conclusão dos RAPs;
- Conclusão da relocação da fibra óptica;
- Conclusão de relocação de postes eléctricos de pau;
- Continuação da limpeza e alargamento de estradas;
- Montagem da Central asfáltica e produção do betão betuminoso para zona urbana do troço Rio Ligonha-Nampula;
- Execução da construção das camadas de sub-base e base;
- Aplicação do revestimento duplo;
- Execução das obras de tapamento de buracos, nivelamento e aplicação de betão betuminoso no troço urbano da Estrada Rio Ligonha-Nampula.

As seguintes entidades estão envolvidas:

Troço Rio Ligonha-Nampula:

- SMEC (Fiscal);
- CMC/Razel, JV (Empreiteiro);
- SMEC/Africare (Implementação do RAP);
- TDM/Televisa (relocação da fibra óptica);
- N´weti (Implementação do HIV/SIDA).

Namialo - Mecutuchi

- Scott Wilson (Fiscal)
- CMC (Empreiteiro do Lote 1) e
- MA/Casais, JV (Empreiteiro do Lote 2)
- PROSIR/Scott Wilson (Implementação do RAP)
- TDM/Televisa (relocação da fibra óptica)
- N´weti (Implementação do HIV/SIDA).



Avaliação do 3º Ano de Execução do Projecto de Acesso e Posse Segura de Terra

Principais Actividades do projecto realizadas:

Apoio à Análise e Monitoria das Políticas e Legislação sobre terras.

- Os seguintes estudos foram concluídos:
- Análise à política e legislação de terras;
- Diagnóstico do sistema de administração de terras (SINAT);
- Situação do género no acesso e administração de terras;
- Avaliação Estratégica no âmbito da ITC;
- Análise institucional do SINAT;
- 15 técnicos visitaram a Tanzânia para a troca de experiências;
- 4 pessoas participaram em seminários internacionais – Conferências do Banco Mundial;
- Realizadas 5 sessões do CAPT, 2 do FCT, 4 do CNA e 1 do CPA;
- Realizado um encontro com os Edis da zona do projecto.

Informação e educação públicas:

- O MINAG aprovou as mensagens a serem disseminadas/projecto;
- Concebida a página web da DNTF;
- Adquirido primeiro lote de material de campanha:
 - 6.000 cópias de vários documentos;
 - 5.000 unidades de material publicitário.
- Em processo de contratação de 4 Provedores de Serviços para a implementação da campanha de Sensibilização Pública.

Apoio às organizações da sociedade civil:

- Ministrados 13/20 cursos a paralegais – 214 graduados;
- Adquiridos 3 conjuntos de equipamento para o apoio aos agrimensores ajuramentados;
- Formadas 35 associações e 36 grupos de interesse no âmbito da ITC;
- 10 organizações da Sociedade Civil (ONG's) envolvidas na implementação de projectos da ITC.

Reforço Institucional ao Sector de Terras:

- Em processo de aprovação a proposta da Revisão Curricular do INFATEC.
- 2 participações em seminários internacionais:
 - 1 participante da DNTF – Austrália
 - 2 participantes do INFATEC – Brasil
- 1 bolsa atribuída a um docente do INFATEC ao Brasil para o nível de Mestrado;
- 75 técnicos dos Distritos e Municípios treinados em GNSS e GIS;
- Aquisição e entrega de equipamento informático e mobiliário para as Entidades de Implementação (DNTF, CENA-

CARTA, INFATEC).

Reforço institucional aos SPGCs da zona norte:

- Adquirido e entregue equipamento diverso aos SPGCs:
 - 1 viatura cada;
 - 2 Workstations, 2 impressoras, 1 plotter e GPS de mão e 1 GNSS.
- Reabilitação pontual de 3 das instalações dos SPGCs de 7 Distritos, 1 em curso e 3 em vista;
- entregue equipamento informático aos distritos;
- Entregue mobiliário de escritório e aparelhos de ar condicionado;
- Alocadas viaturas aos distritos de Lago, Nicoadala, Mecúfi, Mocimboa da Praia e Monapo.

Apoio ao desenvolvimento cadastral nos municípios da zona norte:

- Adquirido e entregue equipamento diverso aos oito municípios sendo:
 - 1 viatura cada;
 - 2 Workstations;
 - 2 impressoras;
 - 1 plotter;
 - 1 GNSS;
 - 1 GPS de mão;
 - Reabilitação pontual das instalações de cadastro municipal;

Simplificação do acesso à terra em áreas seleccionadas:

- Em curso o trabalho de registo de terras e emissão de títulos em 8 municípios e 3 distritos;
- Em curso a delimitação e demarcação de terras comunitárias;
- Assinada emenda ao Contrato com a HTSPE para acomodar a sub-contratação do implementador do LIMS (EXI/ESRI).

Formalização de áreas das comunidades - ITC

| Províncias | Certidões Emitidas* | Títulos emitidos** | Total |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|
| Nampula | 18 | 03 | 21 |
| Niassa | 09 | 0 | 09 |
| Zambézia | 10 | 02 | 12 |
| Total | 37 | 05 | 42 |
| Meta | | | 60 |
| Plano Ano 4 | | | 143/70 |
| Plano Ano 5 | | | 75/72 |



Resultados do registo de terras - Municípios

| Distritos | Parcelas de terra Registrados | Processadas | % | DUAT'S emitidos | DUAT'S entregues |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------|------------------|
| Mocuba | 7.251 | 4.065 | 56 | 1.514 | 0 |
| Quelimane | 6.148 | 3.817 | 62 | 2.898 | 167 |
| Nampula | 4.493 | 3.124 | 70 | 1.993 | 50 |
| Monapo | 6.621 | 4.640 | 70 | 3.288 | 106 |
| Mocímboa | 2.543 | 1.749 | 69 | 1.750 | 0 |
| Pemba | 2.613 | 1.505 | 58 | 1.764 | 250 |
| Lichinga | 5.031 | 4.580 | 91 | 4.016 | 300 |
| Cuamba | 3.044 | 2.681 | 88 | 2.133 | 0 |
| Total | 37.744 | 26.171 | 90 | 19.356/14.986 | 873 |
| Target | 30.000 | 30.000 | 100 | 30.000 | 30.000 |
| Plano Ano 4 | 74.340 | | | | 74.340 |
| Plano ANO 5 | 27.916 | | | | 27.916 |

Resultados dos Registos de Terras - Distritos

| Distritos | Parcelas de Terras Registradas | Processadas | % | DUAT'S emitidos | DUAT'S entregues |
|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| Nicoadala | 1.142 | 913 | 80 | 0 | 0 |
| Mecufi | 478 | 422 | 88 | 0 | 0 |
| Monapo | 348 | 319 | 92 | 250 | 0 |
| Total | 1.912 | 1.654 | 86 | 250 | 0 |
| Meta | 1.500 | | | 1.500 (16%) | 1.500 |
| Plano 4 | 2.000 | | | | 2.000 |
| Plano ano 5 | 2.737 | | | | 2.737 |



Principais realizações do MCA-Moçambique no 3º ano do Compacto (Out 2010 a Set 2011) Projecto de Apoio à Renda do Agricultor (FISP)

Actividades realizadas no ano 3

É importante realçar que com os conhecimentos adquiridos com a implementação do FISP, ficou demonstrado que é possível manter os níveis de infestação de Amarelecimento Letal do Coqueiro a níveis aceitáveis (abaixo dos 2%), com recurso a métodos conhecidos e de fácil uso.

Estes conhecimentos foram incluídos na Estratégia de Maneio e Controle de ALC e da praga de *Oryctes*. Esta, apesar de ter sido validada pelo Conselho Coordenador do MINAG, ainda não foi submetida ao Conselho de Ministros para aprovação e posterior implementação e massificação das medidas de maneio e controlo.

Porém, nem todo o trabalho está a ser feito com os níveis de qualidade desejada, com realce para as actividades relacionadas com o maneio pós-plantio dos novos coqueiros, e com o uso adequado de culturas alternativas. Como forma de melhorar o seu desempenho, o Provedor de Serviços do FISP (ACDI/VOCA)

cancelou o contrato com o seu sub-contratado (Visão Mundial) e apresentou ao MCA um Plano de Acção de Medidas Correcivas a serem desencadeadas de forma a resolver o problema e colocar o projecto dentro das metas esperadas. Estas actividades estão centradas na escolha adequada das áreas e comunidades-alvo e em actividades de extensão agrícola baseadas na mobilização e treinamento dos agricultores com vista a melhorar os cuidados aos novos palmares, aumentando a sua sobrevivência e crescimento.


Os objectivos a curto prazo são:

Diversificação das culturas e introdução das práticas melhoradas de produção e assim ajudar a reestabelecer as receitas perdidas por causa de Amarelecimento Letal do Coqueiro.

Os objectivos a longo prazo são:

Re-estabelecer a produção de côco como uma fonte importante de receitas das famílias, em combinação com as culturas alternativas.

Mapa de Zonas de Actividades - Ano 3

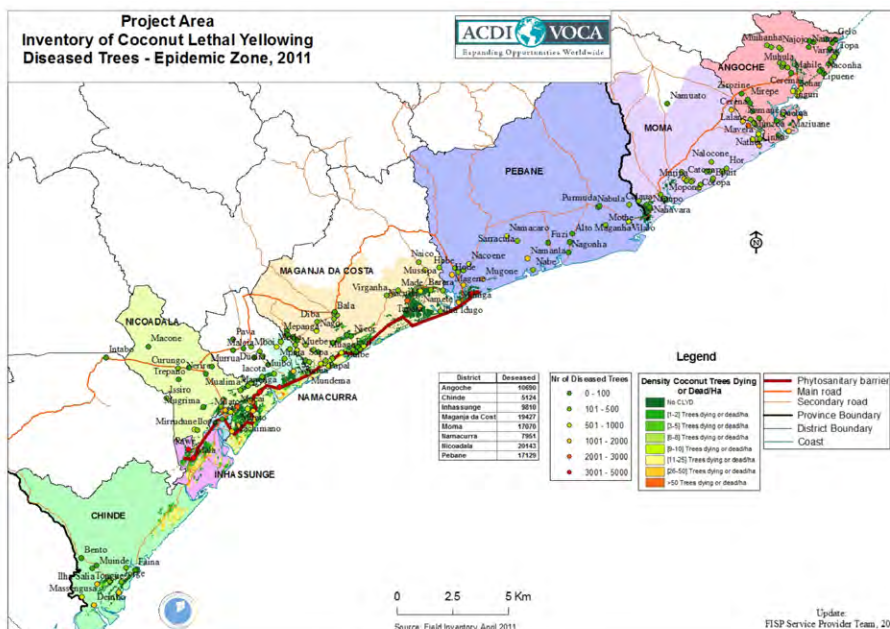



Actividades realizada no ano 3

| % de incidência de CLYD na zona epidémica da Zambézia e Nampula - sector familiar | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Distrito | Ha sob controle | arvores por hectar | Invent. arvores CLYD Set. 2010 | % Incid. Set. 2010 | Invent. Marco 2011 | % Incid. Marco 2011 | Invent. Set. 2011 | % Incid. Set 2011 | # arvores Set. 2011 |
| Chinde | 3956 | 67 | 9628 | 3.6 | 5124 | 2.1 | 2904 | 1.2 | 243752 |
| Inhassunge | 1492 | 126 | 5357 | 2.9 | 9810 | 5.6 | 4087 | 2.5 | 163520 |
| Nicoadala | 9250 | 211 | 12932 | 0.7 | 20143 | 1.0 | 13422 | 0.7 | 1906583 |
| Namacurra | 6860 | 55 | 10255 | 2.7 | 7951 | 2.2 | 4473 | 1.2 | 360237 |
| Maganja | 23878 | 105 | 22415 | 0.9 | 19427 | 0.8 | 6679 | 0.3 | 2437959 |
| Pebane | 4994 | 39 | 24514 | 12.6 | 17129 | 10.6 | 6922 | 4.8 | 143006 |
| Zambezia | 50430 | 108.5 | 85101 | 1.6 | 79584 | 1.5 | 38487 | 0.7 | 5255057 |
| Moma | 3740 | 80 | 10300 | 3.4 | 17070 | 5.9 | 3853 | 1.4 | 267823 |
| Angoche | 3181 | 48 | 20238 | 13.3 | 4069 | 2.9 | 2308 | 1.8 | 126090 |
| Nampula | 6921 | 65.2 | 30538 | 6.8 | 21139 | 5.0 | 6161 | 1.6 | 393912 |
| Total | 57351 | 103.3 | 115639 | 1.95 | 100723 | 1.75 | 44648 | 0.79 | 5648969 |

Actividades realizadas no ano 3

| Indicador | Unidade | Ano 3 | Plano Anos 1 + 2 + 3 | Compact |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1. Limpeza de áreas na zona endémica | Hectares | 3,000 | 7,500 | 8,000 |
| 2. Abate de coqueiros na zona epidémica | Coqueiros | 150,000 | 550,000 | 600,000 |
| 3. Plantio de mudas de coqueiro | mudas | 200,000 | 500,000 | 650,000 |
| 4. Produção de culturas alternativas | Hectares | 3,000 | 5,500 | 8,000 |
| 5. Fundo de desenvolvimento de negócios | \$ | (250,000)/750.000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 6. Treinamento em controlo de pragas e doenças | Produtores | 3,000 | 7,500 | 8,000 |
| 7. Treinamento em plantio e pós-plantio | Produtores | 3,000 | 7,500 | 8,000 |
| 8. Treinamento em produção de culturas alternativas | Produtores | 3,000 | 7,500 | 8,000 |

Actividades realizadas no ano 3

| Indicador | Unidade | Ano 3 | Ano 1+2+3 | Compacto | Ano 3 | Ano 1+2+3 | Ano 3 | Ano 1+2+3 | Compacto |
|--------------------------------------------------|------------|-------|-----------|----------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| Treinamento em controlo de pragas e doenças | Produtores | 3,000 | 8,000 | 8,000 | 5,522 | 5,222 | 184% | 123% | 69% |
| Treinamento em plantio e pós-plantio | Produtores | 3,000 | 4,500 | 8,000 | 9,219 | 9,219 | 307% | 205% | 115% |
| Treinamento em produção de culturas alternativas | Produtores | 3,000 | 4,500 | 8,000 | 3,467 | 5,246 | 116% | 117% | 66% |

As altas taxas de cumprimento das metas são devido de maior número de beneficiários do que previsto. Por exemplo, 11.224 camponeses se beneficiaram de mudas de coqueiro até a data. Com as mudas ainda por distribuir serão abrangidas cerca de 25.000 camponeses.
