



República de Moçambique  
Ministério da Indústria e Comércio

# **RELATÓRIO DE MONITORIA DA EMAN 7ª ronda**

**Abril  
2012**



- Apresenta-se essa como relatório da 7ª ronda de monitoria de implementação da EMAN aprovada pelo Conselho de Ministros (Resolução 3/2008 de 29 de Maio) e com término previsto em finais de 2012.
- Apesar de próximo do final, ainda se constata necessidade de alterações de indicadores pormenorizados devido a redefinição de abordagem de execução das reformas.
- Já se prepara o início de avaliação do impacto da implementação das reformas constantes da EMAN, bem como o apuramento de lições aprendidas com todo esse processo.
- Prepara-se, também, o conceito de elaboração de EMAN II, sucessão da EMAN.



# Apuramentos da 7ª ronda de monitoria de implementação da EMAN

Instituição	Nº de Actividades	% Das Actividades	% de Execução em
MIC	12	22%	79%
BM	3	7%	46%
MCT	2	4%	71%
MTC	4	7%	77%
ME	3	7%	57%
MF	9	16%	95%
MFP	1	2%	100%
MITRAB	3	5%	85%
MJ	14	25%	66%
MAE	1	1%	100%
CRA	2	3%	84%
CNELEC	1	1%	63%
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>	<b>77%</b>




# Comparação com resultados anteriores

MONITORIA EM 15.11.2011		MONITORIA EM 15.03.2012	
Nº DE TAREFAS	55	Nº DE TAREFAS	55
GRAU DE CUMPRIMENTO	76%	GRAU DE CUMPRIMENTO	77%

Instituição	% de Execução em 15.11.2011	% de Execução em 15.03.2012	% do Progresso Registrado
MIC	76%	79%	3%
BM	59%	46%	-13%
MCT	74%	71%	-3%
MTC	60%	77%	17%
ME	71%	57%	-14%
MF	100%	95%	-5%
MFP	42%	100%	68%
MITRAB	83%	85%	2%
MJ	61%	66%	5%
MAE	63%	100%	37%
CRA	84%	84%	0%
CNELEC	59%	59%	0%

# Comparação com resultados anteriores

## Cont...

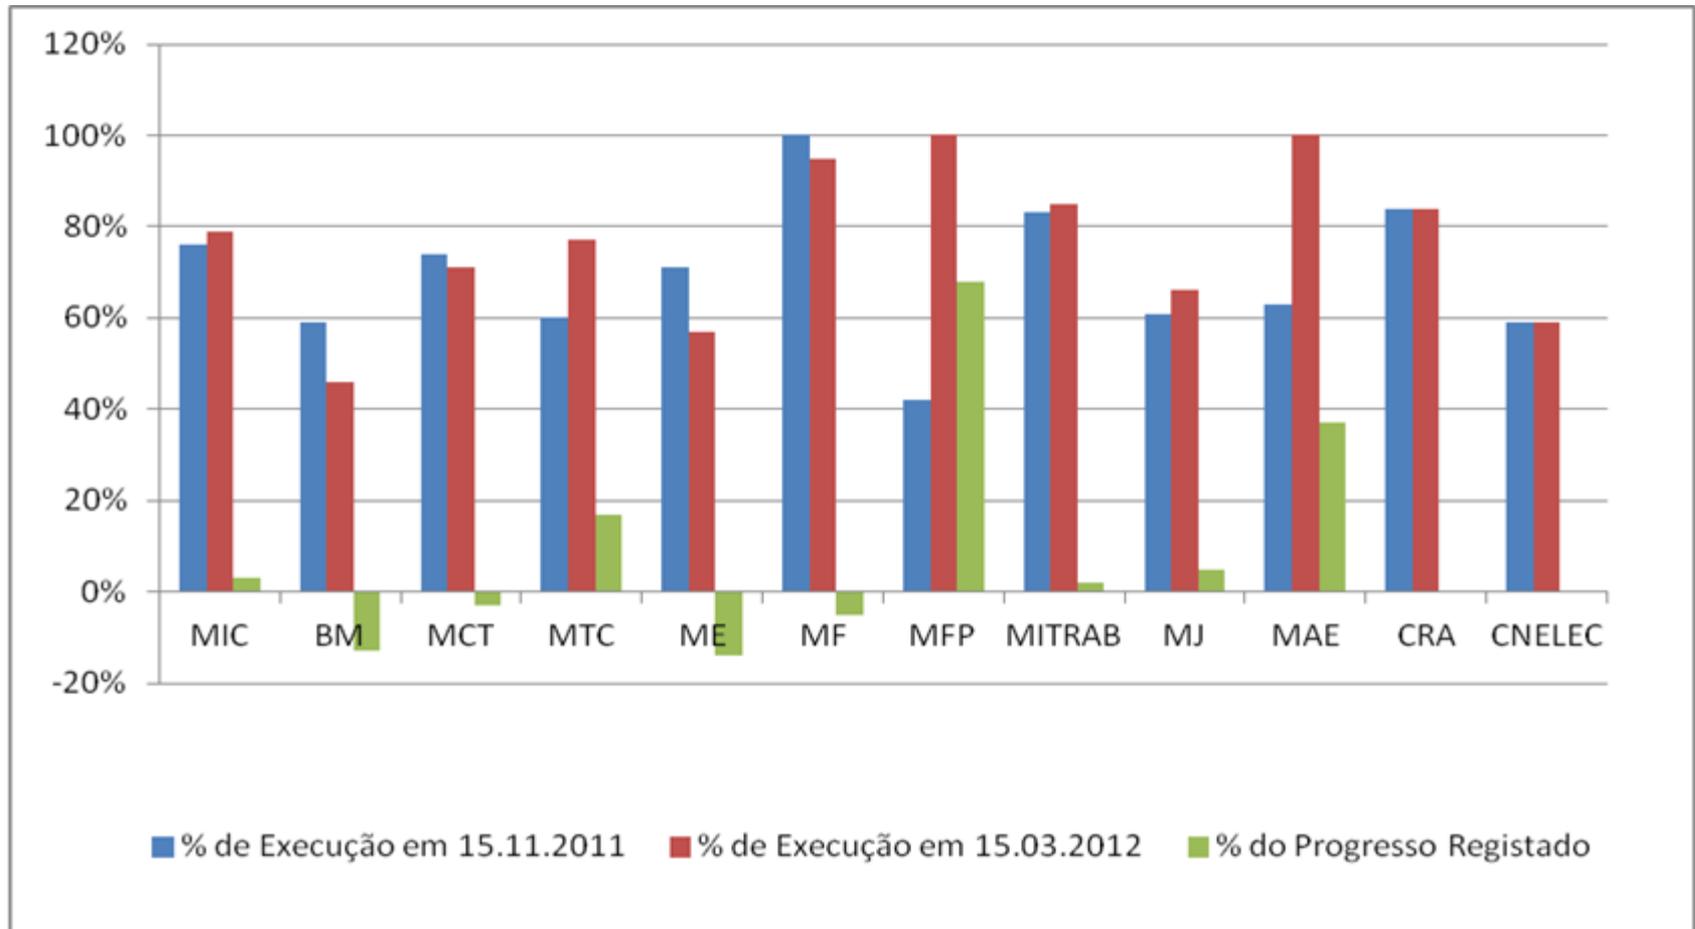



# Resultados apurados

- 28 (aprox. 51% da matriz) actividades concluídas a 100%**
  - 6 MJ
  - 6 MIC
  - 3 BM
  - 2 MITRAB
  - 2 MTC
  - 6 MF
  - 1 ME
  - 1 CRA
  - 1 MFP
- 08 (aprox. 15% da matriz) actividades concluídas a 75%**
  - 3 MIC
  - 3 MJ
  - 1 ME
  - 1 MCT
- 12 (22% da matriz) actividades com execução acima de 50%**
  - 4 MIC
  - 1 MJ
  - 2 MTC
  - 1 CNELEC
  - 1 CRA
  - 1 MITRAB
  - 1 MF
  - 1 MCT
- 03 (5% da matriz) actividades com execução abaixo de 50%**
  - 1 ME
  - 1 BM
  - 1 MJ
- 04 (aprox. 7% da matriz) actividades com 0% de execução**
  - 1 BM
  - 3 MJ



# Principais constatações

Instituições	Constatações
<b>ME</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Iniciado processo de revisão do sistema tarifário da EDM;</li><li>•Revisão da Lei de Electricidade está em curso;</li><li>•Em curso a revisão do Decreto 63/2006 de 26 de Dezembro sobre incentivo ao combustível;</li><li>•criado e instalado o sistema de gestão de reclamações pela EDM.</li></ul>
<b>MF/ATM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Instalação do sistema de pagamento de reembolsos via e-Sistafe previsto para 2ª semana do mês em curso.</li></ul>
<b>BM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Alterados os indicadores pormenorizados e as datas de cumprimento.</li></ul>
<b>MAE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Terminou a monitoria de output. Inicia monitoria de resultado e impacto.</li></ul>
<b>MFP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Com a aprovação da Lei 14/2011, suplantando a necessidade da Carta da Função Publica.</li></ul>
<b>MIC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Em processo a operacionalização do CIN ;</li><li>•Iniciado plano de melhoria de serviços dos BAU e sua consolidação.</li></ul>
<b>MTC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•As actividades programadas para final do primeiro semestre.</li></ul>

# Principais constatações cont...



Instituições	Constatações
<b>MJ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Estudo sobre o Sistema Gratuito para o Registo de Microempresas verifica atraso na sua efetivação devido à falta de cabimento orçamental.</li><li>•AR analisou e decidiu dar competência legislativa ao Conselho de Ministros para aprovação a Lei de Insolvência e Recuperação dos empresários comerciais.</li><li>•Prevê-se realização do estudo sobre o sistema para a execução expedita de penhoras, até o final do primeiro semestre.</li><li>•Esta a decorrer um trabalho entre o MJ e o MTRAB para reactivar os Tribunais Laborais previsto para 2013.</li></ul>
<b>MCT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•51 Distritos estão ligados à GovNet.</li><li>•os Centros Provinciais de Recurso Digital (Maputo Província e Manica) em processo de adjudicação da obra de construção.</li><li>•Todas as capitais provinciais já estão ligadas ao E-Government.</li></ul>
<b>MTRAB</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Na área laboral foram aprovados os Regulamento sobre o Trabalho Desportivo e de Segurança Privada. Os restantes dispositivos legais serão aprovados a partir de Junho do corrente, de acordo com a agenda do Conselho de Ministros.</li></ul>

# Principais constatações

## Cont...



Instituições	Constatações
<b>CNELEC</b>	•Foi elaborada a proposta de Regulamento das Condições Gerais de Fornecimento da Energia Eléctrica e submetida ao Gabinete do Ministro.
<b>CRA</b>	•Apesar de não ter nenhuma actividade programada para este quadrimestre foram reportadas acções relativas à assinatura dos Acordos Regulatórios, com vista a regulação dos Sistemas Público de Abastecimento de Água da Ilha de Moçambique e Mocímboa da Praia bem como a realização de consultas públicas para o estabelecimento dos Fóruns de Consulta de Água naquelas vilas municipais.

# Informações das províncias



Após o processo de capacitação dos pontos focais de todos os GIPs, prevê-se a inclusão dos relatórios periódicos destes nos encontros do GIRBI.

Província	Constatações
<b>Niassa</b>	A matriz abrange todos os sectores previstos na EMAN, mas há necessidade de adequa-la ao formato provincial, dai que a DASP está analisar a informação.
<b>Cabo Delgado</b>	Sem informação
<b>Nampula</b>	Sem informação
<b>Tete</b>	A matriz abrange todos os sectores previstos na EMAN e a informação está a ser analisada pela DASP.
<b>Zambézia</b>	Sem informação
<b>Manica</b>	Sem informação
<b>Sofala</b>	Sem informação
<b>Inhambane</b>	Dado o contexto actual, o ponto focal solicitou protelamento do prazo de entrega matriz e informação adicional sobre o estágio da implementação.
<b>Gaza</b>	Sem informação
<b>Maputo Província</b>	Sem informação



# PAMAN

- Plano de Acção para Melhoria do Ambiente de Negócios 2012 (PAMAN) é uma matriz consolidada de reformas e acções com vista a melhoria do ambiente de negócios, permitindo a inclusão de temas prioritários emergentes e serve como transição para a implementação da EMAN II.
- O PAMAN será monitorado em paralelo à EMAN, baseando no mesmo sistema de monitoria e alicerçando-se de mesmos mecanismos de monitoria que a EMAN.
- O processo de monitoria do PAMAN iniciou com a migração de progressos das actividades da EMAN e das matrizes detalhadas por parte das diversas entidades de tutela.
- Prevê-se a apresentação do 1º relatório de monitoria do PAMAN no próximo GIRBI, após apresentação do conceito de monitoria e constatações iniciais aos Conselho Económico e Social e depois ao Conselho de Ministros em finais de Abril.



**OBRIGADO!**

